Zürich, ETH HPT

WOCHENBAUPROGRAMM vom 06. Mai bis 17. Mai 2024

kurzfristige Änderungen vorbehalten

lärmintensive Arbeiten!

ghisleni.
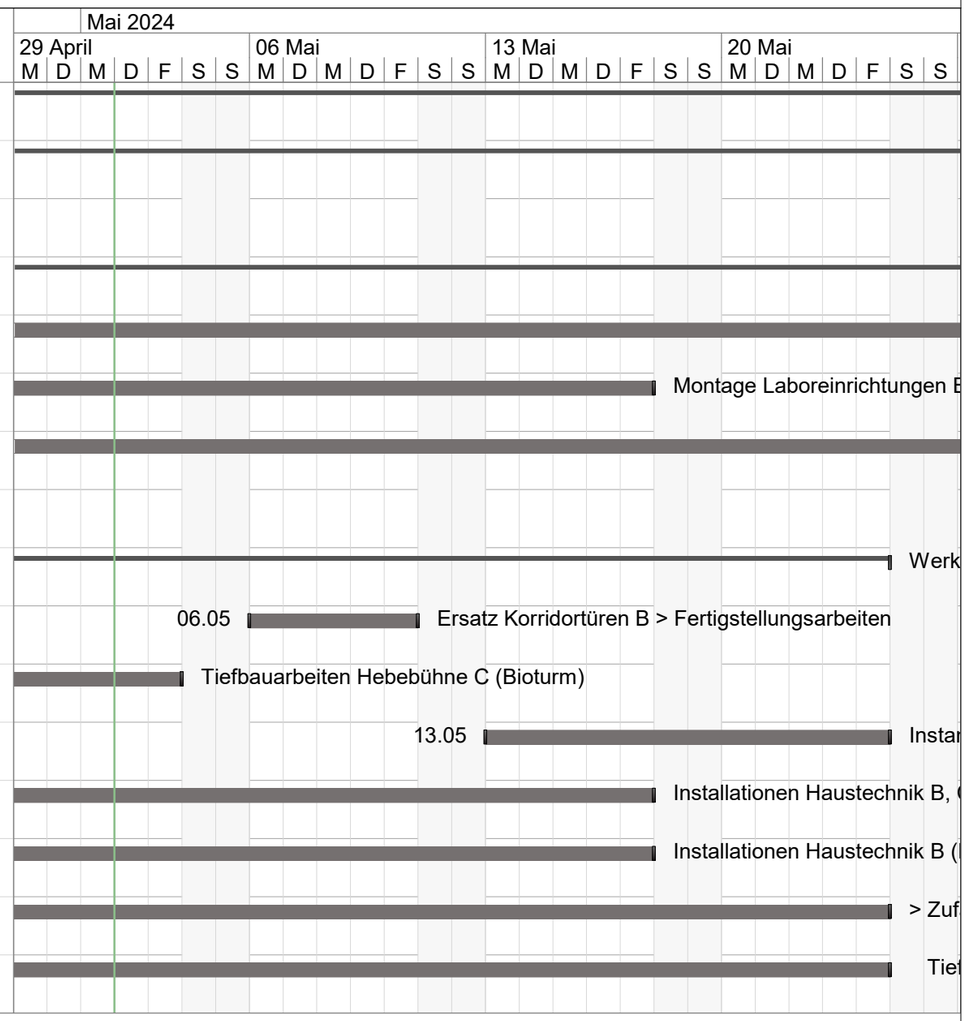
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	UNTERNEHMER
1	**Phase 52 Ausführung**	**150 Tage**	**Mon 23.10.23**	**Fre 31.05.24**	
2	**Wochenbauprogramm KW 19 / 20**	**150 Tage**	**Mon 23.10.23**	**Fre 31.05.24**	
3					
4	**Südtrakt (Geschoss A-F)**	**115 Tage**	**Mon 11.12.23**	**Fre 31.05.24**	
5	Arbeiten Innenausbau C, D, E	115 Tage	Mon 11.12.23	Fre 31.05.24	Diverse
6	Montage Laboreinrichtungen B, C, D, E	80 Tage	Mon 29.01.24	Fre 17.05.24	Renggli AG
7	Fertiginstallationen Haustechnik B, C, D, E	115 Tage	Mon 11.12.23	Fre 31.05.24	Diverse
8					
9	**Werkstatttrakt (Geschoss B-C)**	145 Tage	Mon 23.10.23	Fre 24.05.24	
10	Ersatz Korridortüren B > Fertigstellungsarbeiten	5 Tage	Mon 06.05.24	Fre 10.05.24	Geilinger AG
11	Tiefbauarbeiten Hebebühne C (Bioturm)	15 Tage	Mon 15.04.24	Fre 03.05.24	Implenia AG
12	Instandstellung Umgebung Hebebühne C (Bioturm)	10 Tage	Mon 13.05.24	Fre 24.05.24	Implenia AG
13	Installationen Haustechnik B, C (Bioturm)	75 Tage	Mon 05.02.24	Fre 17.05.24	HAT Unternehmer
14	Installationen Haustechnik B (Luftschutzkeller)	75 Tage	Mon 05.02.24	Fre 17.05.24	HAT Unternehmer
15	**> Zufahrt HPT via Otto-Stern-Weg während**	145 Tage	Mon 23.10.23	Fre 24.05.24	Information
16	**Tiefbauarbeiten nur bis max. 3.5m Breite möglich!**	145 Tage	Mon 23.10.23	Fre 24.05.24
